


Obiekt ED-3A

Lokalizacja Estakada drogowa projektowana w ciągu drogi S17 w km 4+070,00

Konstrukcja: belkowa ,beton sprężony

Długość 287,00 m+17,64m

Szerokość 17,30 m

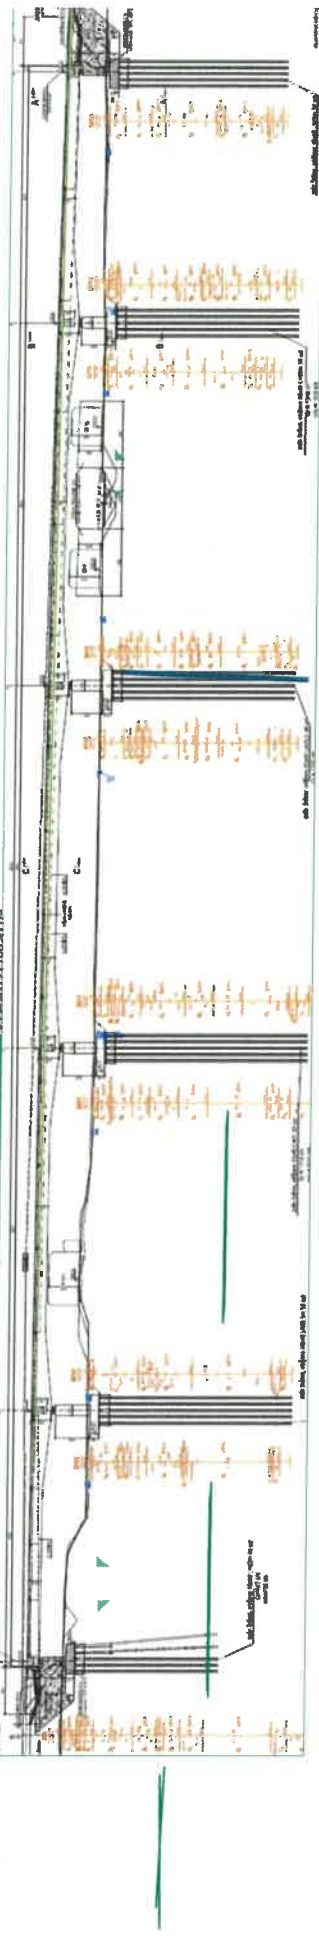

ROK 2021			
ST	Rodzaj wykonywanych robót	Zaawansowanie wykonanych robót [%]	Narastająco [%]
Roboty wykonane w miesiącu LISTOPAD			
M.21.01.01	instalacja pali żelbetonowych prefabrykowanych pod.nr.1 do 6	100%	100%
M.11.01.01	wykopy fundamentowe pod. nr.1,2,3,6	70%	
M.1103.06	próbnne obciążenie pali-dynamiczne pod. nr.123456	100%	100%
M.13.02.01	beton niekonstrukcyjny pod. nr.1,2,3,6	60%	
Roboty wykonane w miesiącu listopad			
	wykopy fundamentowe pod podpory nr.4 i 5	100%	100%
	beton niekonstrukcyjny pod podpory nr.4 i 5	100%	100%
	zbrojenie fundamentów podpór nr.1, 2, 3, 4, 5, 6	100%	100%
	betonowanie fundamentów podpór nr 1, 2, 3, 4, 5, 6	100%	100%


OBIEKT WD-6D

Lokalizacja:

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w miejscowości Dąbrowa w km 6+196 projektowanej drogi S-17

Konstrukcja: rama monolityczna stal/beton
 Ilość przęseł: 1
 Długość [m]: 2,91
 Szerokość [m]: 10.00

planowane
 realizowane
 zrealizowane

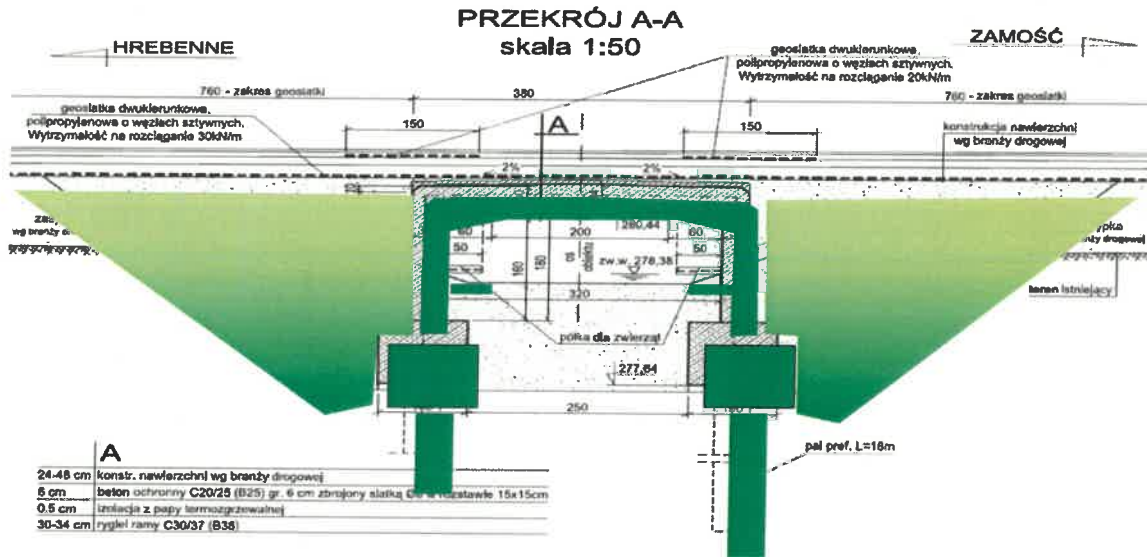

ROK 2021 Październik			
ST	Rodzaj wykonywanych robót	Zaawansowanie wykonanych robót [%]	Narastająco [%]
Roboty wykonane w miesiącu LISTOPAD			
M.11.01.01	wykonanie wykopu pod płytą denną	100%	100%
M.13.02.01	wykonanie betonu niekonstrukcyjnego-płyta denna i skrzydła	100%	100%
M.12.01.02	wykonanie zbrojenia płyty dennej	100%	100%
M.1301.00	zabetonowanie płyty dennej	100%	100%
Roboty wykonane w miesiącu listopad			
	beton niekonstrukcyjny pod fundamenty skrzydeł	100%	100%
	zbrojenie i deskowanie fundamentów skrzydeł	100%	100%
	zabetonowano fundamenty skrzydeł	100%	100%
