


Obiekt ED-3

Lokalizacja Estakada drogowa projektowana w ciągu drogi S17 w km 4+070,00

Konstrukcja: belkowa ,beton sprężony

Długość 287,00 m+17,64m

Szerokość 12,30 m

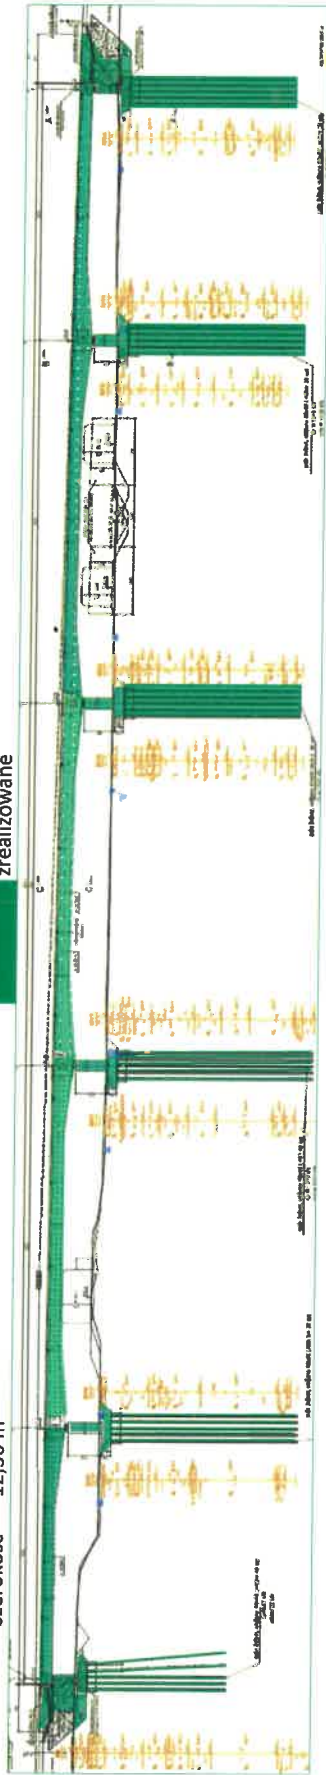

ROK 2020 październik


ST	Rodzaj wykonywanych robót	Zaawansowanie wykonanych robót [%]	Narastająco [%]
Roboty wykonane w miesiącu październiku:			
M.23.02.01.	Beton ustroju nośnego ETAP II	40%	100%
M.23.02.01.	Sprężenie ustroju nośnego ETAP II	30%	100%
M.27.02.01.	Izolacja gruba pod kapami	10%	10%
M.23.02.01.	Montaż kofew talerzowych	10%	10%
M.28.01.01.	Montaż krawężnika kamiennego na obiekcie	10%	10%
M.28.02.03.	Montaż desek gzymosowych	10%	10%
M.23.02.01.	Zbrojenie kap chodnikowych przęsta 1 i 2	10%	10%
M.28.01.01.	Montaż krawężnika kamiennego na długości skrzydeł od P1	10%	10%
M.28.01.05.	Montaż krawężnika zanikającego od P1	50%	50%

Obiekt WD-8

lokalizacja Wiadukt w ciągu łącznicy węzła W2 'Tomaszów Lubuski Południe nad projektowaną S-17 w km 8+442,51

Konstrukcja: Płytkowo belkowa dwuprzęsłowa o układzie ramownicowym wolnopodparta
Długość : 57,80 m;
Szerokość: 2x 8,75

	planowane
	realizowane
	zrealizowane

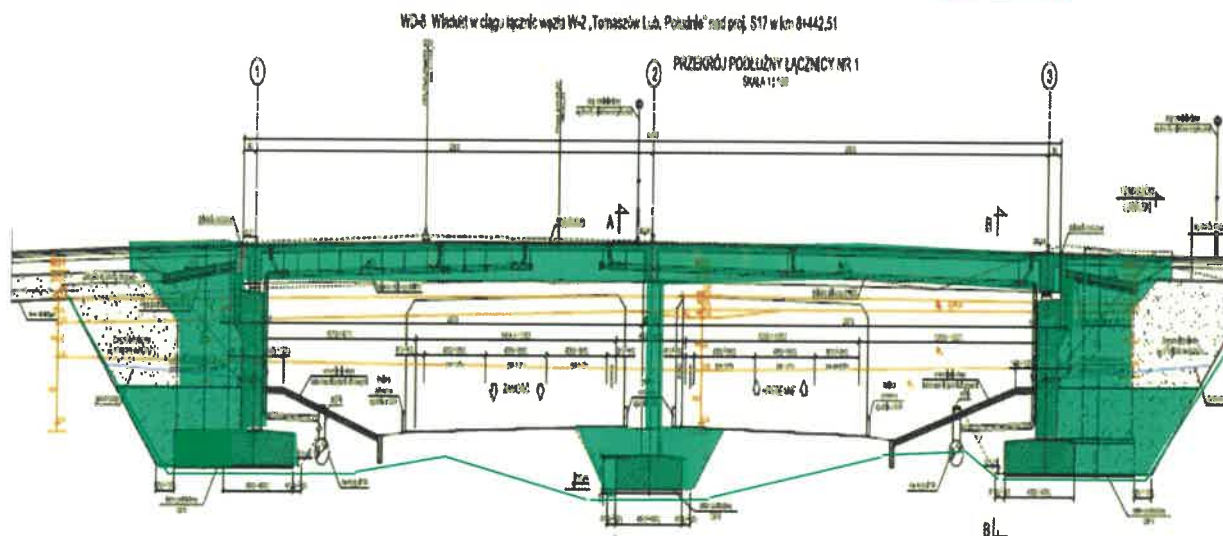

ROK 2020 październik			
ST	Rodzaj wykonywanych robót	Zaawansowanie wykonanych robót [%]	Narastająco [%]
Roboty wykonane w miesiącu październiku:			
M.28.05.02.	Montaż balustrady w pasie rozdziału	50%	100%

