


OBIEKT MD-1

Lokalizacja: Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w miejscowości Dąbrowa w km 0+122,00 projektowanej drogi S-17

Konstrukcja: rama monolityczna stal/beton
 Ilość przęseł: 1
 Długość [m]: 12,8
 Szerokość [m]: 3,2

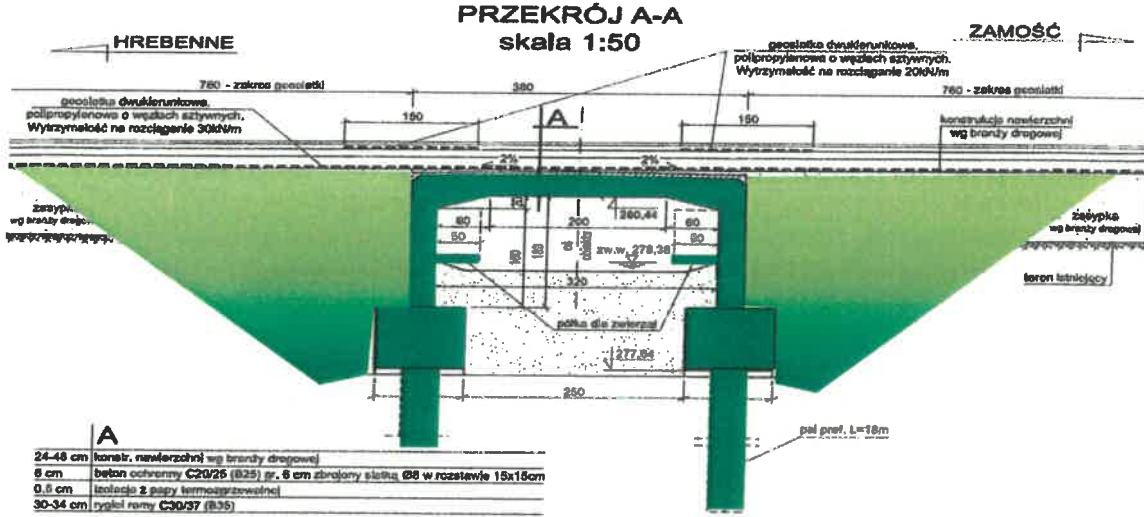

ROK 2021 czerwiec			
ST	Rodzaj wykonywanych robót	Zaawansowanie wykonanych robót [%]	Narastająco [%]
Roboty wykonane w miesiącu czerwcu:			
M.11.01.01	Wykonanie zasyпки stożków do 100%	100%	100%
M.23.25.01	Montaż półek dla małych zwierząt do 100%	100%	100%
M.29.20.01	Wykonanie umocnienia skarp stożków matami polimerowymi z humusowaniem i obsianiem trawą	100%	100%
M.29.20.01	Wykonanie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych	100%	100%
M.29.25.01	Montaż punktów pomiarowych	100%	100%
M.30.05.02	Nawierzchnia góry gzymsu i skrzydełek	100%	100%
M.30.05.06	Wykonanie nawierzchni betonowymi elementami drobnowymi	100%	100%
M.30.05.06	Ustawienie obrzeży betonowych	100%	100%

