


OBIEKT WD-6D

Lokalizacja:

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w miejscowości Dąbrowa w km 6+196 projektowanej drogi S-17

Konstrukcja: rama monolityczna stal/beton
 Ilość przęseł: 1
 Długość [m]: 2,91
 Szerokość [m]: 10,00

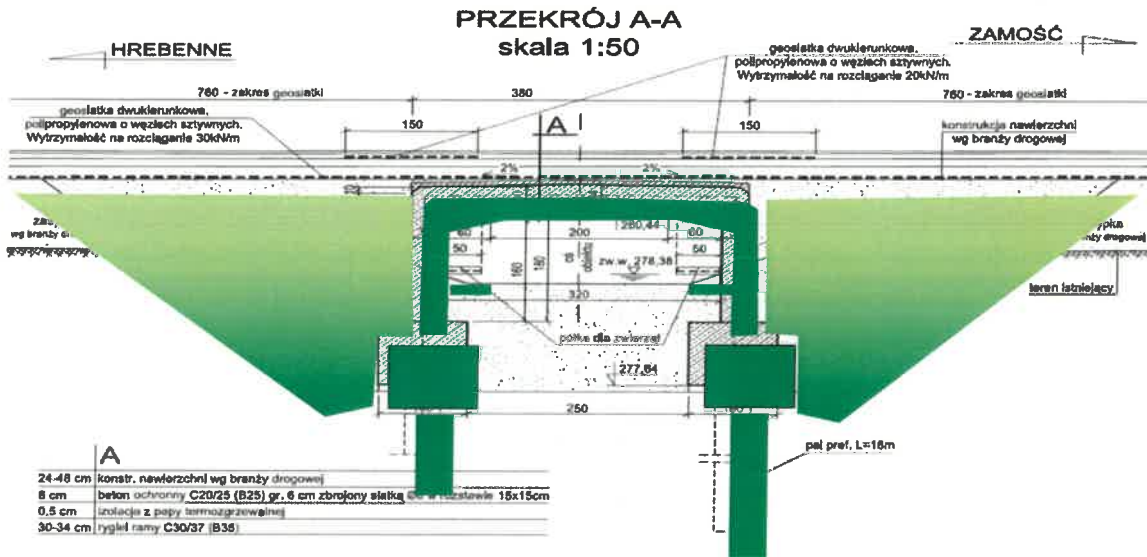

ROK 2022			
ST	Rodzaj wykonywanych robót	Zaawansowanie wykonanych robót [%]	Narastająco [%]
Roboty wykonane w miesiącu październik:2021			
M.11.01.01	wykonanie wykopu pod płytę denną	100%	100%
M.13.02.01	wykonanie betonu niekonstrukcyjnego-płyta denna i skrzydła	100%	100%
M.12.01.02	wykonanie zbrojenia płyty dennej	100%	100%
M.1301.00	zabetonowanie płyty dennej	100%	100%
Roboty wykonane w miesiącu listopad 2021			
	beton niekonstrukcyjny pod fundamenty skrzydeł	100%	100%
	zbrojenie i deskowanie fundamentów skrzydeł	100%	100%
	zabetonowano fundamenty skrzydeł	100%	100%
Roboty wykonane w miesiącu grudzień 2021			
	zbrojenie ramy	100%	100%
	deskowanie eamy	100%	100%
Roboty wykonane w miesiącu styczeń 2022			
	Okres zimowy. Brak prac budowlano montażowych.		
